Progetto di riqualificazione dell'Orto Botanico (Stralcio II) e del Campus Filippo Re, Bologna

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA | AREA TECNICA, EDILIZIA E SOSTENIBILITÀ

Progetto Esecutivo

CODICI EDIFICI

CUP: J32B23001930005 | TICKET: 56428

TITOLO GIURIDICO IMMOBILI
Proprietà demaniale in concessione a Alma Mater Studiorum – Università di Bologna in regime di diritto pubblico superficiario

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
arch. LUCA PEDRAZZI
(FIRMATO DIGITALMENTE)

DIRETTORE DEI LAVORI
arch. EVA RIMONDI
(FIRMATO DIGITALMENTE)

IMMAGINE RAPPRESENTATIVA DEL PROGETTO

PROGETTISTA INCARICATO
arch. FEDERICO SCAGLIARINI
arch. CRISTINA TARTARI

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
ing. ANDREA POZZI

PROGETTO ARCHITETTONICO E DEL VERDE
arch. FEDERICO SCAGLIARINI — collaboratori
arch. CRISTINA TARTARI — arch. LORENZO CONTI
arch. ELENA VINCENZI — arch. FEDERICA ZOBOLI

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
-

PROGETTO SMALTIMENTO RISORSA IDRICA
ing. ANGELO MARIA ZANOTTI

COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO
arch. GIOVANNA DE JESUS

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI
ing. GUSTAVO BERNASCONI

LOGHI

TA SCA
studio architetti associati

REV	DATA	OGGETTO TAVOLA
01	30/09/2025	CRONOPROGRAMMA PSC
02	24/10/2025	

SCALA	N. progressivo EE	NOME TAVOLA
-	79	PE-PSC-PR-003

Nome Fase - Descrizione	Durata gg	Area
Diagramma di Gantt	365	
Allestimento cantiere	21	Intero cantiere
Percorsi principali	90	FASE A ORTO BOTANICO
Percorso sospeso in grigliato metallico	21	FASE A ORTO BOTANICO
Biologo	40	FASE A ORTO BOTANICO
Collina piante cactacee	30	FASE A ORTO BOTANICO
Laboratorio	14	FASE A ORTO BOTANICO
Apparato didascalico	14	FASE A ORTO BOTANICO
Pulizia generale degli elementi incongrui e preparazione	21	FASE B CAMPUS F. RE
Percorsi (posa pavimentazioni, interventi sul verde, illuminazione e reti idriche)	120	FASE B CAMPUS F. RE
Palazzina della Viola: interventi sul Quadripartito	60	FASE B CAMPUS F. RE
Velostazioni e schermature (area compost, isola ecologica)	61	FASE B CAMPUS F. RE
Apparato didascalico [1]	15	FASE B CAMPUS F. RE
Piantumazione opere a verde	90	FASE B CAMPUS F. RE
Smobilizzo cantiere	15	Intero cantiere

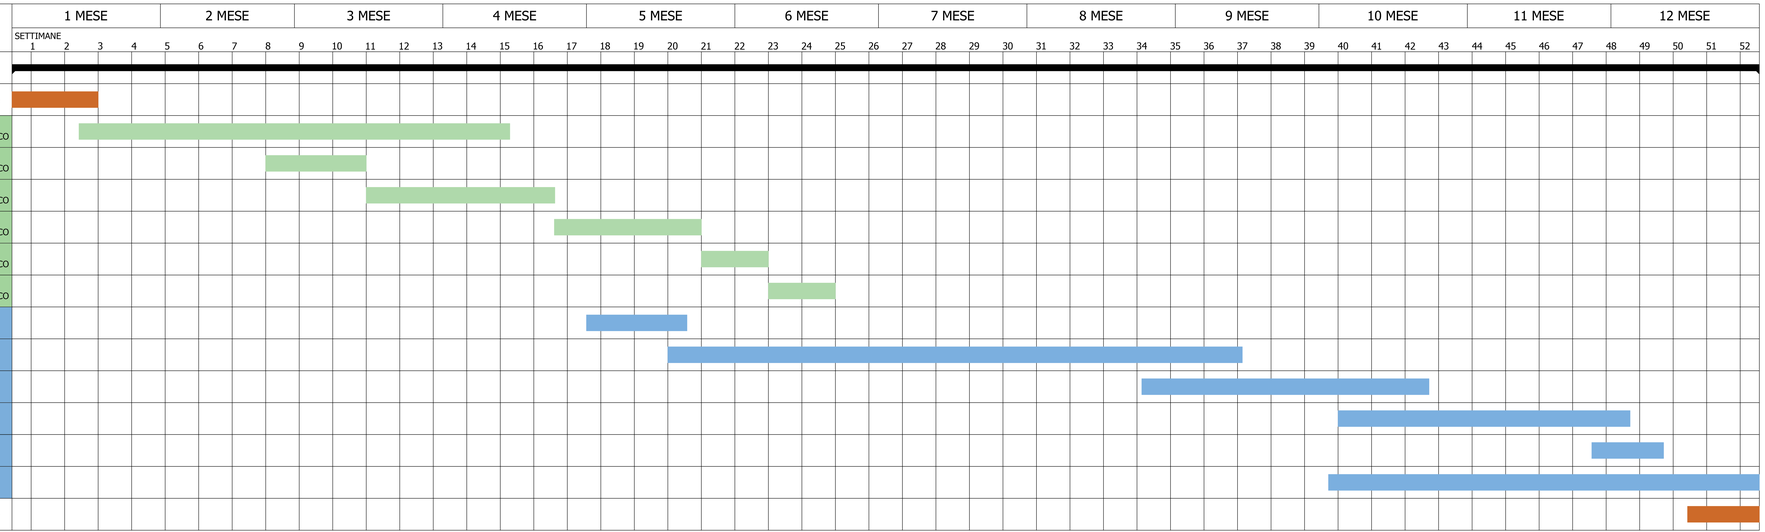

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE: 14+14 gg
Intervento di pulizia e cura straordinaria della vegetazione
Prelievi campioni terreno per caratterizzazione materiale da scavo
Scavo assistito (vedi scavi per posa pavimentazioni e reti)
